EW Rothrist
Wasser und Strom.

# Wasserversorgung Rothrist
01.01.2020 - 31.12.2020

| | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Pumpwerke | 2 | | 2 | * |
| Förderleistung | 8'200 | lt./Min. | 8'200 | lt./Min. |
| Reservoir / Inhalt 4'800 m3 | 2 | | 2 | |
| Austausch-Pumpwerk mit Oftringen | 1 | | 1 | |
| Förderleistung APW-O | 2'000 | lt./Min. | 2'000 | lt./Min. |
| Austausch-Pumpwerk mit Aarburg | 1 | | 1 | |
| Förderleistung APW-A | 2'000 | lt./Min. | 2'000 | lt./Min. |
| Hauptleitungsnetz | 76.6 | km | 76.7 | km |
| Hausanschlussnetz | 39.2 | km | 39.6 | km |
| neu verlegte Hauptleitungen | 285 | m | 195 | m |
| Sanierung Hauptleitungen | 367 | m | 615 | m |
| neu verlegte Hausleitungen | 497 | m | 135 | m |
| Sanierung Hausleitungen | 285 | m | 471 | m |
| neue Hausanschlüsse | 19 | Stk. | 6 | Stk. |
| eingebaute Wasserzähler | 2'251 | Stk. | 2'265 | Stk. |
| Wasserleitungsbrüche | 16 | Stk. | 17 | Stk. |
| Pumpwerkstörungen | 0 | Stk. | 1 | Stk. |
| Hydranten San. (Ersatz) | 4 | Stk. | 4 | Stk. |
| Hydranten Abbruch | 2 | Stk. | 2 | Stk. |
| Hydranten neu | 1 | Stk. | 0 | Stk. |
| Hydranten total | 524 | Stk. | 522 | Stk. |

| Verbrauchsstruktur m³ | 2012 m³ | 2013 m³ | 2014 m³ | 2015 m³ | 2016 m³ | 2017 m³ | 2018 m³ | 2019 m³ | 2020 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrie | 493'481 | 532'474 | 543'752 | 552'405 | 556'221 | 471'593 | 444'876 | 427'689 | 392'671 |
| Haushalt/Gewerbe | 433'921 | 439'727 | 442'101 | 487'488 | 465'462 | 473'085 | 506'846 | 492'578 | 520'020 |
| öffentliche Brunnen | 25'000 | 25'000 | 25'000 | 25'000 | 25'000 | 12'500 | 12'500 | 12'500 | 12'500 |
| Total Abgabe | 952'402 | 997'201 | 1'010'853 | 1'064'893 | 1'046'683 | 957'178 | 964'222 | 932'767 | 925'191 |
| Ungemessen/Verluste/Ableseabw. | 192'010 | 148'639 | 59'874 | 174'986 | 134'258 | 251'766 | 194'272 | 133'260 | 130'933 |
| **Total Fördermenge** | **1'144'412** | **1'145'840** | **1'070'727** | **1'239'879** | **1'180'941** | **1'208'944** | **1'158'494** | **1'066'027** | **1'056'124** |
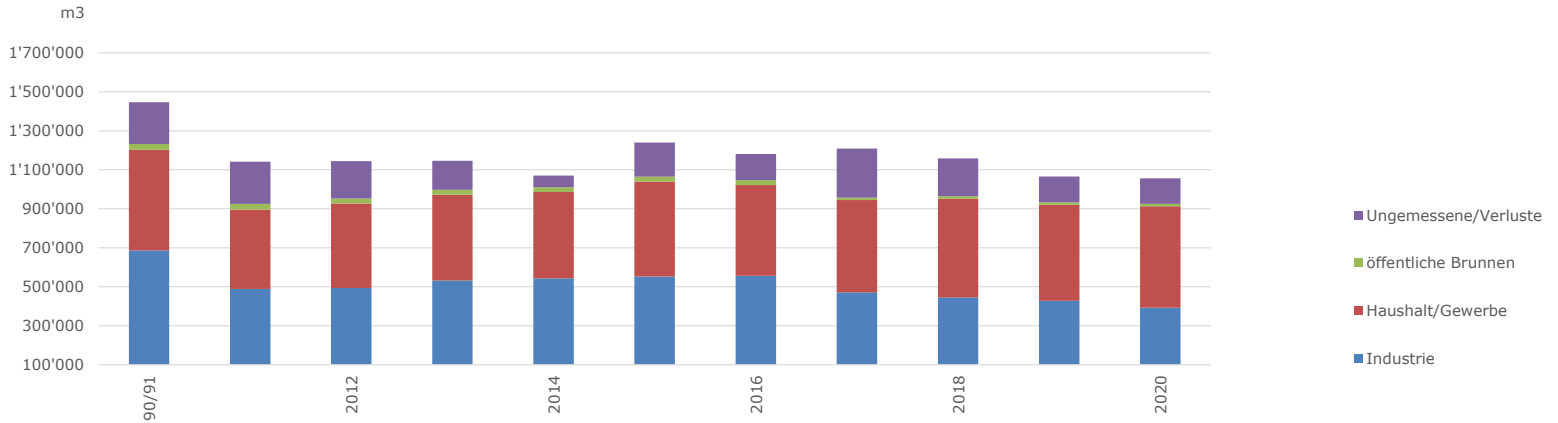
*PW Rägelerhof ab 20. April 2020 ausser Betrieb (Sanierung Fassung I und Ausbau Fassung II)
